
Laboratorio de Desarrollo Rural
Universidad Autónoma de Querétaro
Facultad de Ciencias Naturales, Campus Concá

Versión para la asamblea ejidal de La Florida

Cronograma hipotético del anteproyecto

Habilitación de la orilla de la Presa de La Florida, Arroyo Seco, Querétaro

Octubre de 2026 a noviembre de 2028

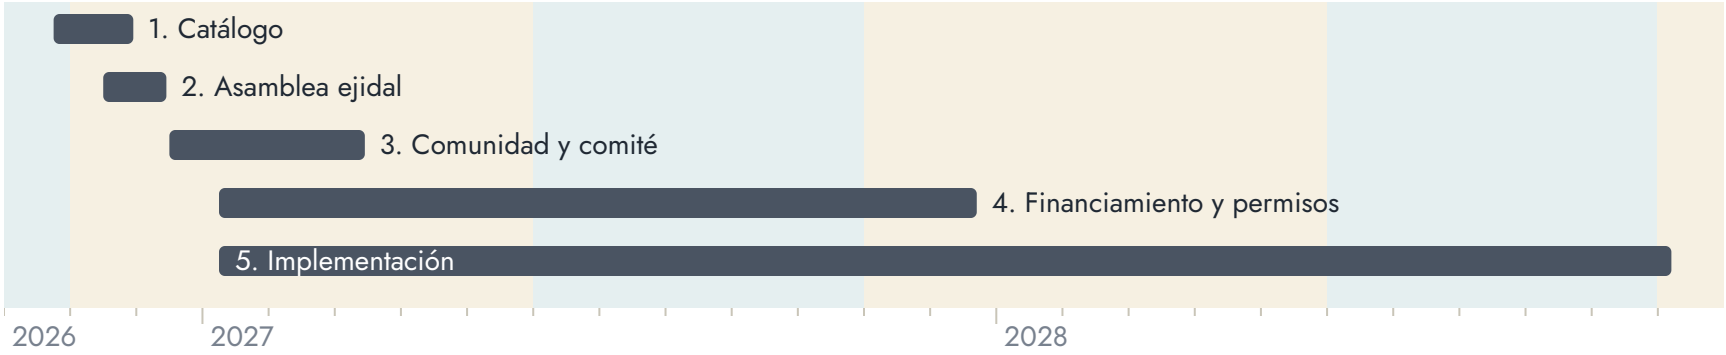

Lo que se pide al ejido


El calendario es hipotético: cada paso depende de que el anterior se cumpla. Estos son los momentos en que el proyecto necesita una decisión o el trabajo del ejido.

Cuándo	Qué se pide al ejido	Qué queda
1–7 dic 2026	Escuchar el catálogo de propuestas, pedir los cambios que considere, decidir si da su anuencia y acordar el domingo de la presentación a la comunidad.	Acta de asamblea con los acuerdos; si se aprueba, acta de anuencia
ene 2027	Acordar con los ganaderos cerrar el paso del ganado a la zona del vertedor.	Minuta firmada con los ganaderos
8–14 mar 2027	Aprobar en asamblea el reglamento de uso de la orilla, antes de Semana Santa.	Acta con el reglamento aprobado
feb 2027 – may 2028	Participar en las faenas de trancas, fajinas, cajetes, siembra y palapas. Cada jornal se registra como aportación en especie.	Bitácora de jornales valorizados
sep 2027	Escuchar la lectura de las plantas vivas a los tres meses de la siembra (meta: 30 de 40 árboles).	Tabla de plantas vivas y acta de lectura
nov 2027	Revisar el reglamento después de la primera temporada de uso.	Acta de asamblea con ajustes
abr – may 2028	Recibir el informe final del proyecto.	Informe con fotos de punto fijo y acta de lectura

> **Si la asamblea no da su anuencia.** Se ajusta el catálogo con lo que pidió la asamblea y se presenta de nuevo. Sin anuencia no se construye nada. El acta de anuencia también es requisito para solicitar el apoyo de PROCODES en marzo de 2027.

El calendario en cinco fases

Las fases se traslapan: lo que la comunidad puede hacer con sus propios medios arranca en enero de 2027, sin esperar los permisos.

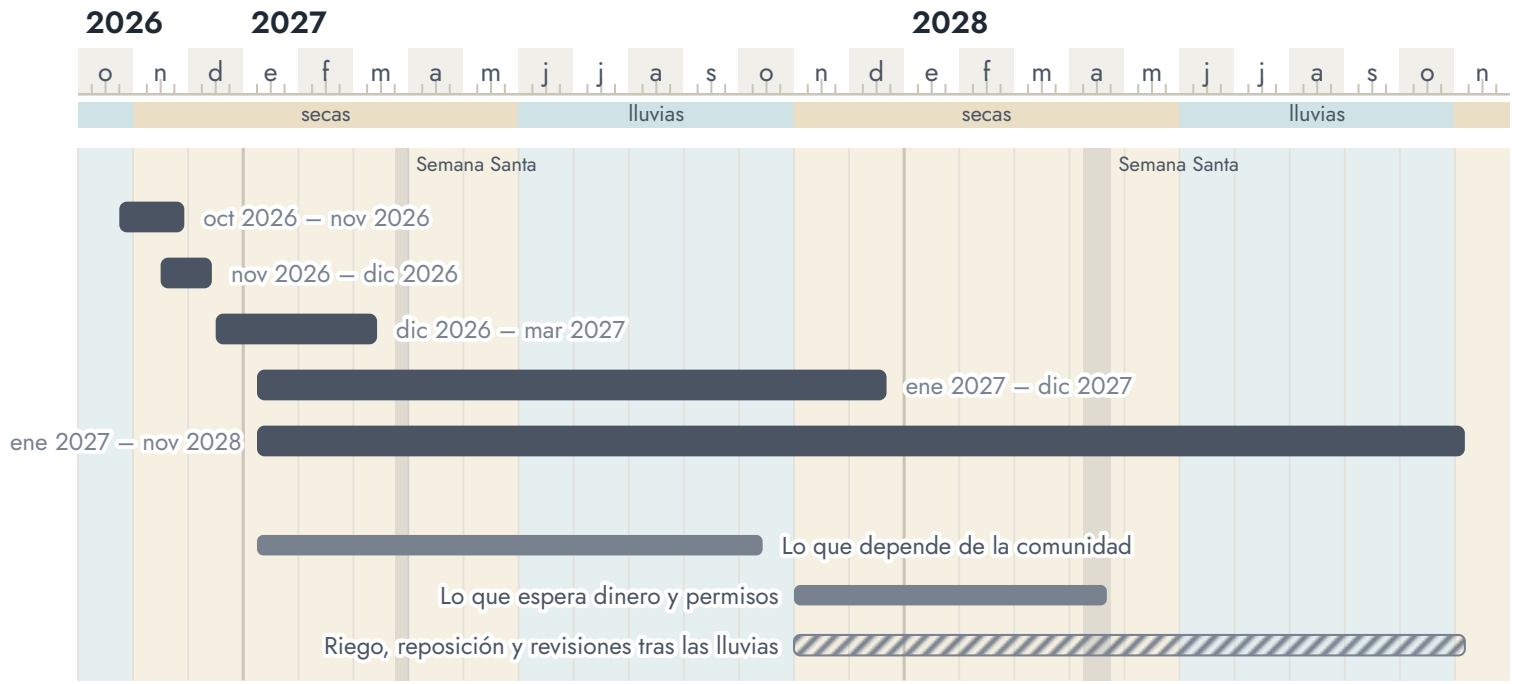


Fase	Qué ocurre
1. Catálogo	Los seis equipos integran sus propuestas en el catálogo y en este cronograma.
2. Asamblea ejidal	La asamblea conoce el catálogo, pide cambios y decide si da su anuencia.
3. Comunidad y comité	Presentación en la orilla, comité de la presa y reglamento aprobado antes de Semana Santa.
4. Financiamiento y permisos	Faenas, Ayuntamiento, PROCODES y CONAFOR; permisos ambientales y de zona federal.
5. Implementación	Primero lo que la comunidad hace con sus medios; después lo que espera dinero y permisos.

Qué se hace en la orilla y cuándo

Los seis componentes del anteproyecto. Cada barra es una tarea; la franja gris marca Semana Santa y el fondo distingue las secas de las lluvias.

Componente	Qué deja	Cuándo
1a Contener la erosión de la orilla	Talud junto al vertedor con cerco, fajinas, trampa de azolve y estacas vivas; ganado fuera.	ene – oct 2027
1b Revegetar con especies nativas	Dos corredores de monte cercados, corredor de fauna en el cauce, cuarenta árboles con cajete y sombra plantada donde irán palapas y bancas.	ene 2027 – jun 2028
2 La comunidad cuida y vigila la orilla	Comité de la presa con acta, reglamento aprobado en asamblea, recorridos por turnos y letreros de reglas y bienvenida.	ene 2027 – nov 2028
3 Recreación para las distintas edades	Tres rutas señaladas en la zona de los pinos, muelle de 8 × 4 m con cinco boyas de profundidad y conteos de visitantes por edades.	ene 2027 – nov 2028
4 El espacio se mantiene seguro y limpio	Contenedores con ruta de recolección, fantasmas luminiscentes, barreras vivas, estacionamiento con cerca de acceso y cinco lámparas solares.	ene 2027 – nov 2028
5 Espacios de convivencia y descanso	Tres palapas de 4 × 4 m con mesa, bancas y asador, diez bancas en la orilla y una explanada de 200 m².	feb 2027 – nov 2028

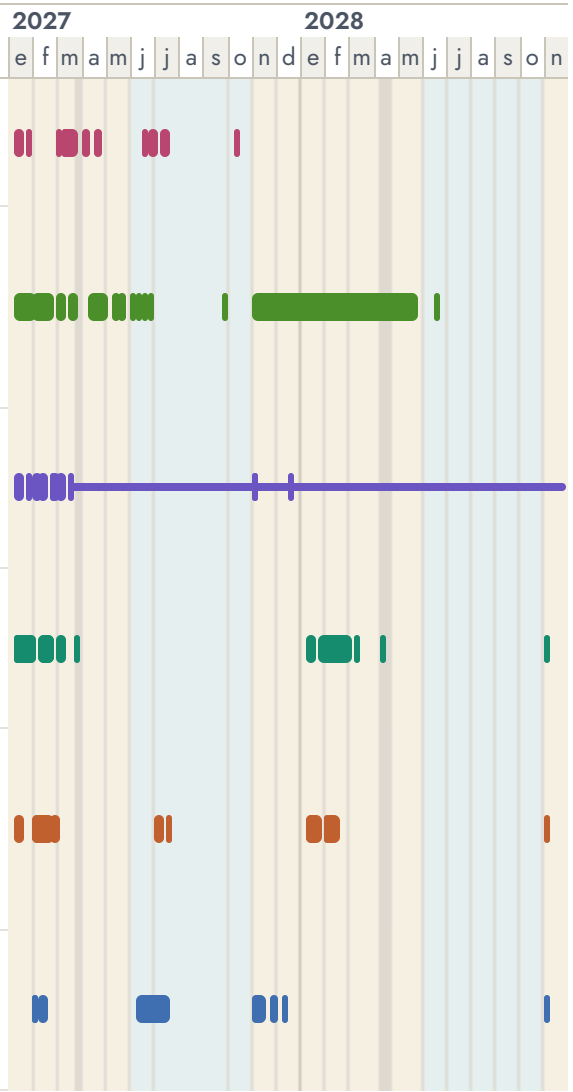

Trabajo programado Espera de un permiso o dictamen Tarea continua, como los recorridos

Seis compuertas

Una compuerta es una decisión de la que depende lo que sigue. La última columna dice qué pasa con el proyecto si la respuesta es no.

Cuándo	Compuerta	Quién la lleva	Si la respuesta es no
1–7 dic 2026	◇ Anuencia del ejido	Comisariado ejidal	Se ajusta el catálogo con lo que pidió la asamblea y se presenta de nuevo. Sin anuencia no se construye nada.
15–21 dic 2026	◇ Consentimiento de la comunidad	Delegado de La Florida	Las piezas rechazadas salen del catálogo o se reformulan. El comité no se forma sobre un no.
22–30 abr 2027	◇ Apoyo PROCODES autorizado	CONANP · Dirección Regional	La ola 1 sigue con autogestión; palapas, bancas, explanada y letreros grandes esperan la convocatoria siguiente.
15–21 ago 2027	◇ Autorización de impacto ambiental	SEMARNAT	Las piezas observadas se rediseñan o salen del proyecto; lo que no es obra sigue su curso.
15–21 nov 2027	◇ Concesión de zona federal	CONAGUA	El muelle y las boyas no se construyen; el resto del proyecto sigue sin ellos.
15–21 dic 2027	◇ Presupuesto municipal 2028 con las obras del proyecto	Ayuntamiento · Obras Públicas	Estacionamiento, cerca, luminaria y muelle se recorren un año o buscan otra fuente.

Lo que puede atrasar el calendario

Los efectos se calcularon con el mismo calendario: se atrasa una fecha y se recorre todo lo que depende de ella, respetando secas, lluvias y plazos.

Qué puede pasar	Qué se movería	Qué se haría
La anuencia llega tarde	Con cuatro semanas de atraso: Semana Santa de 2027 llega sin reglamento, letreros ni contenedores; la solicitud a PROCODES pierde la ventanilla de marzo y palapas, bancas y explanada se recorren un año; el cierre pasa a 8–14 abr 2029, 45 semanas después.	Pedir el punto antes del 25 de noviembre; si la asamblea se recorre, convocar una extraordinaria en enero y reducir la primera ola a lo que pide Semana Santa.
El dinero llega tarde	Con ocho semanas: el muelle no llega a Semana Santa de 2028; el cierre no se mueve. Con dieciséis: parte de la obra de PROCODES rebasa el 31 de diciembre; el muelle pasa a las secas siguientes; el cierre pasa a 8–14 abr 2029, 45 semanas después.	Comprar materiales en julio con el primer depósito de PROCODES y dejar lista la faena de palapas para noviembre.
Los permisos tardan	Con ocho semanas por permiso: la autorización ambiental rebasa los 150 días de PROCODES y el apoyo se cancela; el muelle no llega a Semana Santa de 2028; el cierre no se mueve.	Ingresar la manifestación de impacto ambiental en marzo de 2027 y separar el muelle del resto si la concesión se detiene.
Las lluvias se adelantan o se retrasan	La siembra y las estacas vivas pierden su ventana y esperan un año.	Tener los cajetes listos al final de mayo y sembrar con las primeras lluvias reales.
